


МОБИЛЬНОСТЬ

РАБОЧЕЕ МЕСТО РУКОВОДИТЕЛЯ

Эдуард Вострилов

Руководитель проектов

SetlGroup

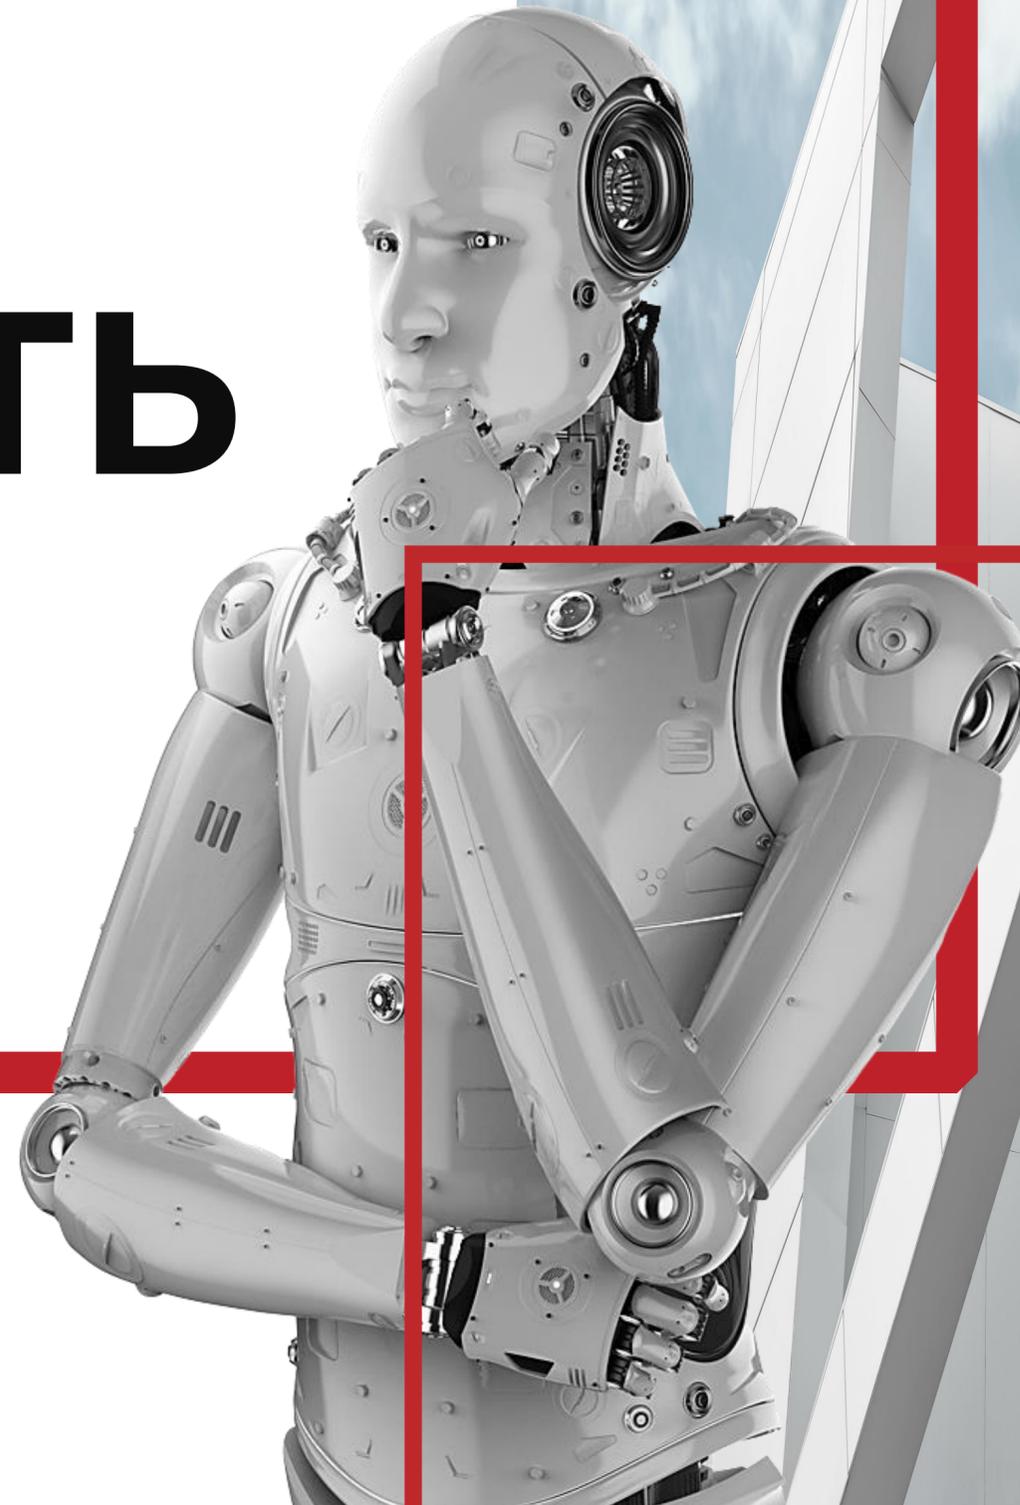

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ

1

МОБИЛЬНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ
ДОКУМЕНТОВ

2

ЕДИНЫЙ ВХОД
В ЗАЩИЩЕННЫЙ КОНТУР

3

ВЫДАЧА ПОРУЧЕНИЙ
И ИХ КОНТРОЛЬ

4

ПОИСК И ФИЛЬТРАЦИЯ

5

СТАТУСЫ ЗАДАНИЙ
И СОГЛАСОВАНИЙ

6


ИНТЕГРАЦИЯ
С КОРПОРАТИВНОЙ СЭД

ВХОД И ДОБАВЛЕНИЕ ИКОНКИ

АВТОРИЗАЦИЯ И УДОБСТВА


- Единый аккаунт на все программные решения
- Веб-приложение (возможность добавления иконки на домашний экран)
- Системные настройки по запоминанию паролей
- Вход в защищенный контур без VPN и подключения к удаленному рабочему столу

Стартовая страница

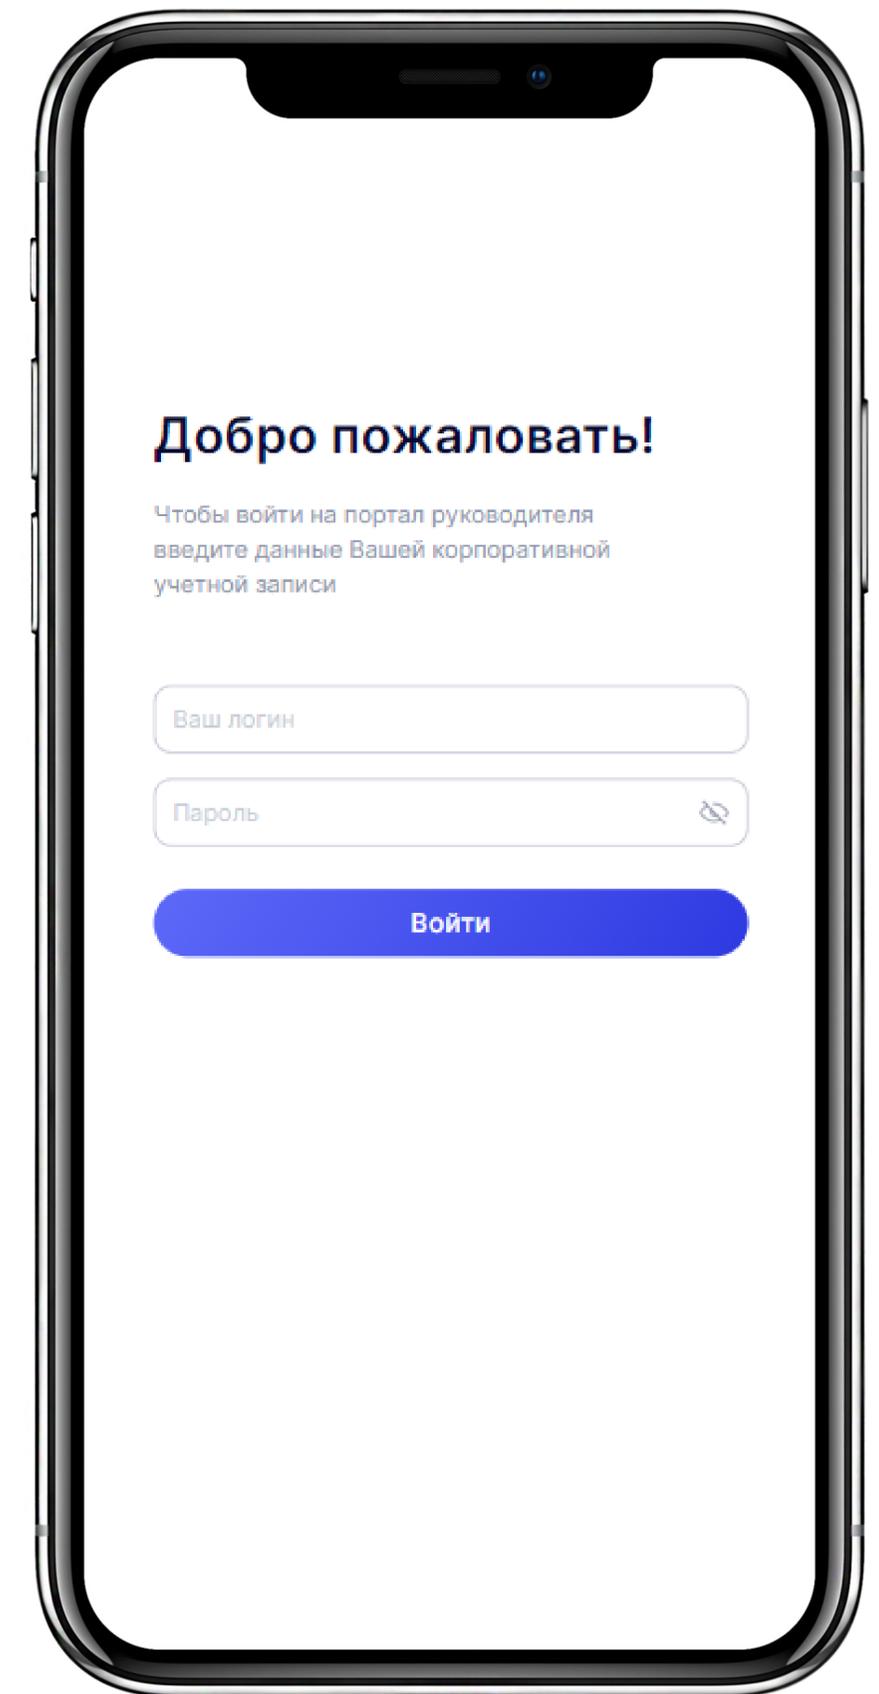


ГЛАВНЫЙ ЭКРАН, ФИЛЬТРАЦИЯ И ПОИСК


- Просмотр карточек заданий на согласование
- Фильтрация с запоминанием выбора (при повторном входе выбранные значения фильтра сохранятся)
- Поиск по трем символам и категориям:
 - По названию документа
 - По дате документа
 - По номеру документа
 - По контрагенту или по исполнителю

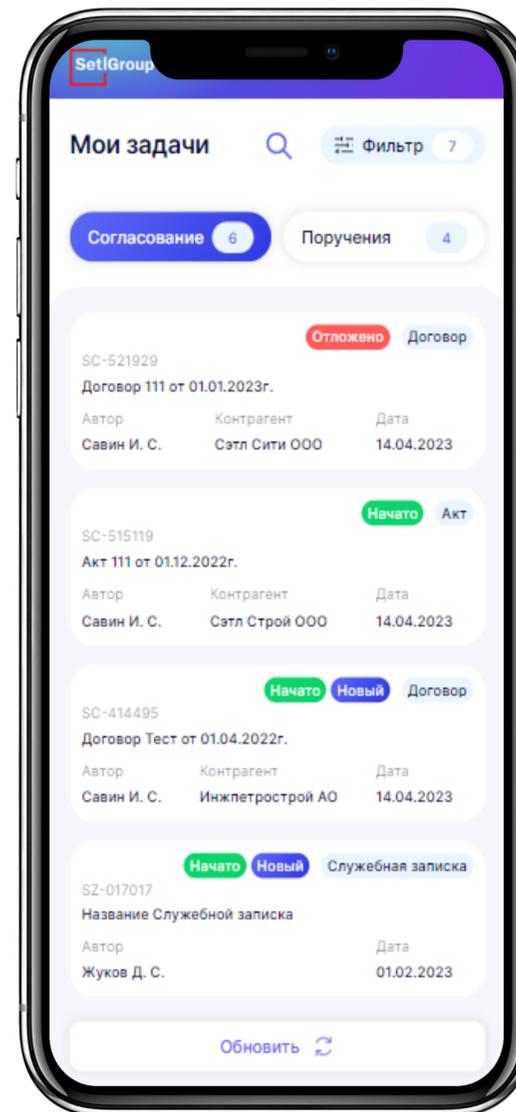

Главная страница

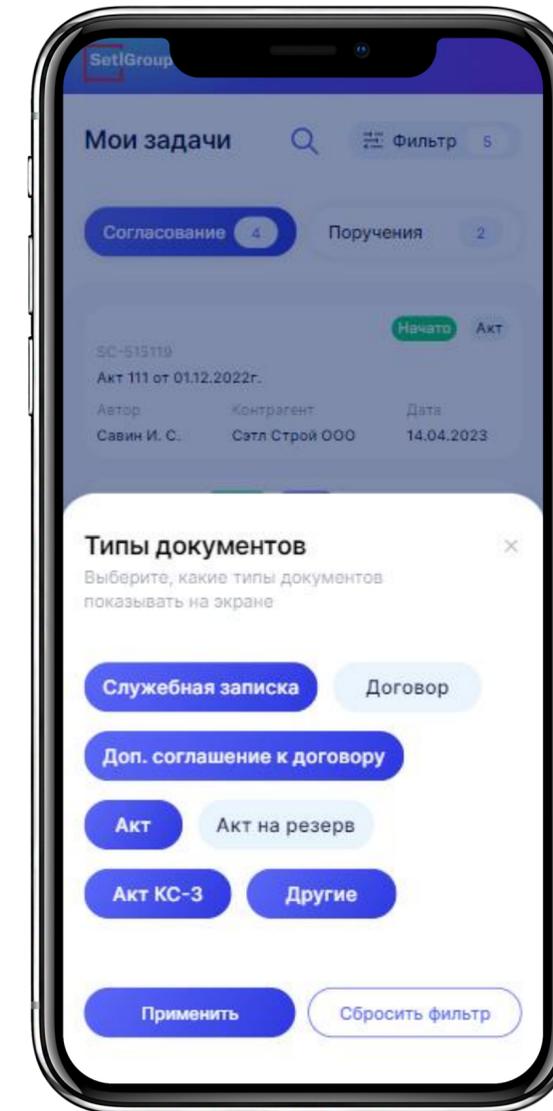

Фильтрация

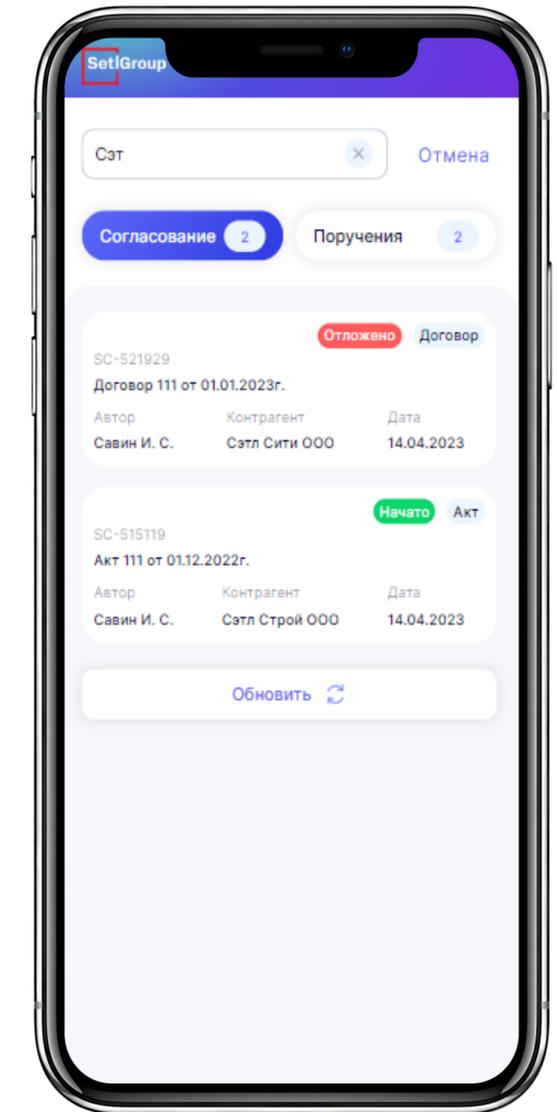

Поиск


КАРТОЧКА ЗАДАНИЯ НА СОГЛАСОВАНИЕ

ВОЗМОЖНОСТИ:

- Просмотр документов онлайн (без скачивания)
- Согласовать или отклонить с комментарием
- Просмотр листа согласования

В КАРТОЧКЕ ЗАДАНИЯ НА СОГЛАСОВАНИЕ СОДЕРЖАТСЯ:


- Общие данные
- Состав пакета
- Прикрепленные файлы
- Лист согласования

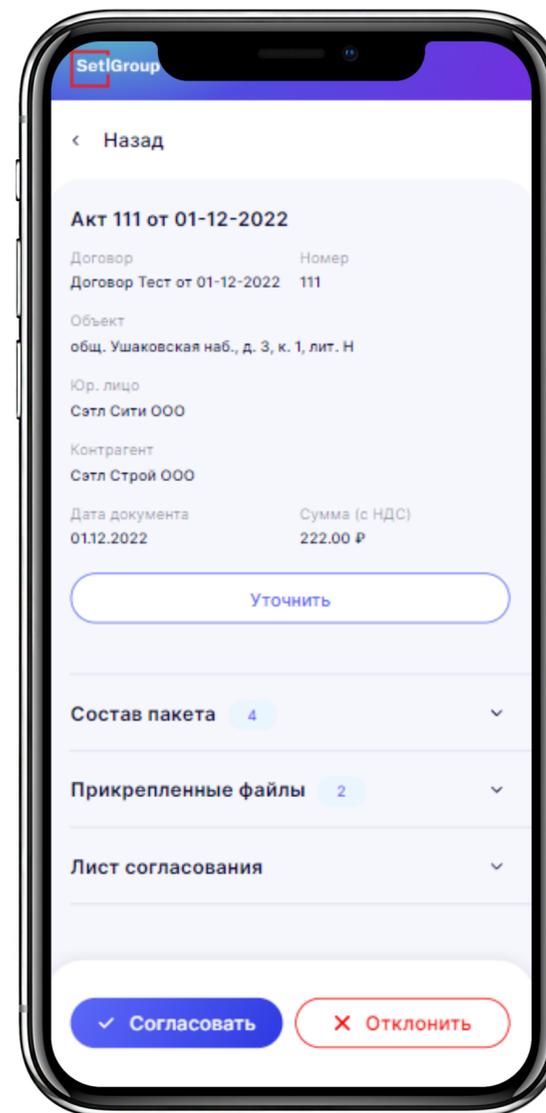

Карточка задания
на согласование



Просмотр документов

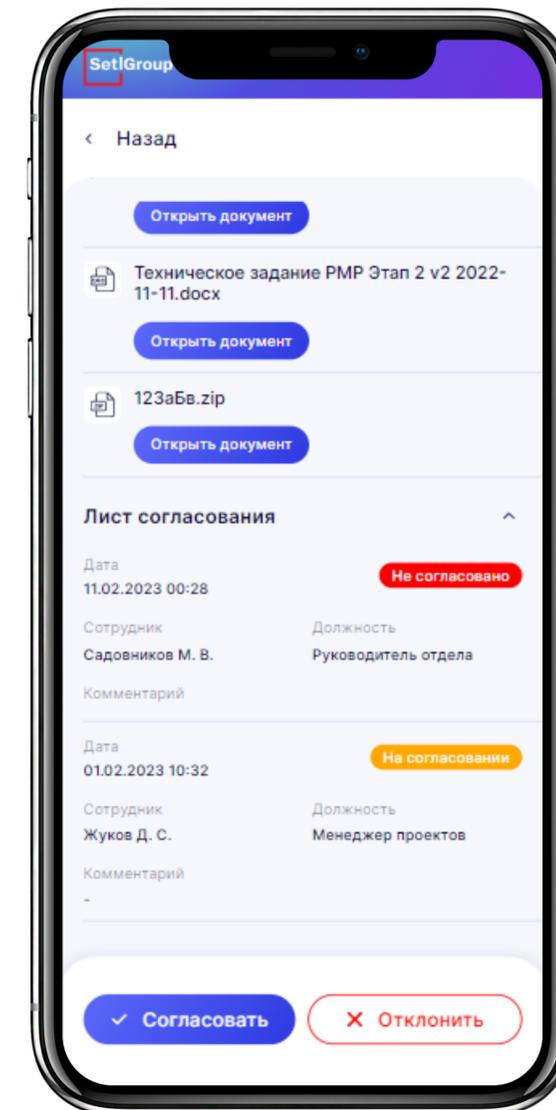


Лист согласования
и документы

ВЫДАЧА СВЯЗАННЫХ С ДОКУМЕНТОМ ПОРУЧЕНИЙ


БЛОК ПОРУЧЕНИЯ:

- Можно отслеживать статус выданных поручений
- Идентификация по просроченным поручениям
- Поиск и фильтрация


Поле «**Выбор исполнителя**» интегрировано с телефонным справочником, поиск осуществляется по ФИО (минимум 3 символа)

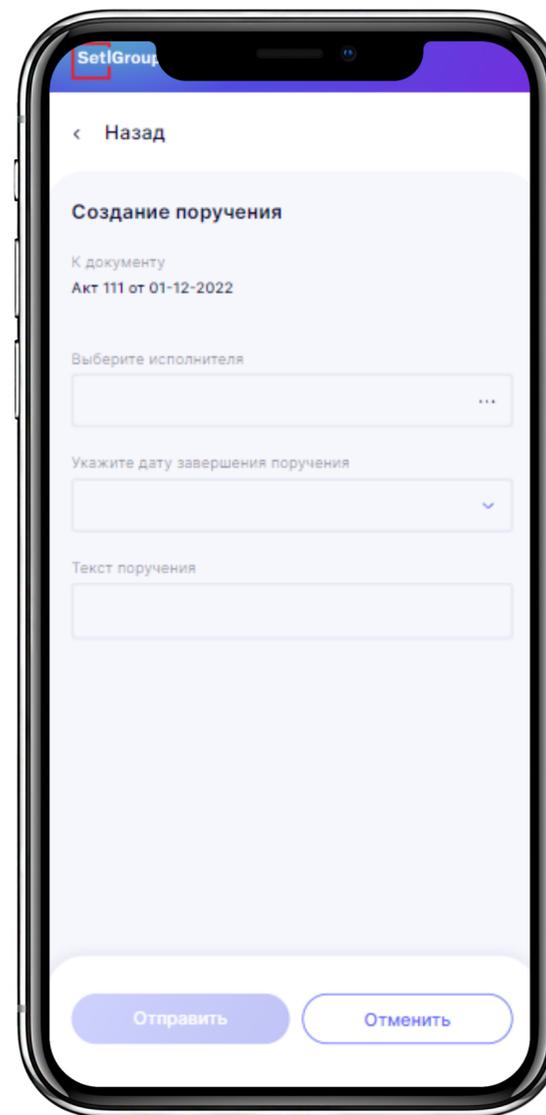

Страница выдачи поручения

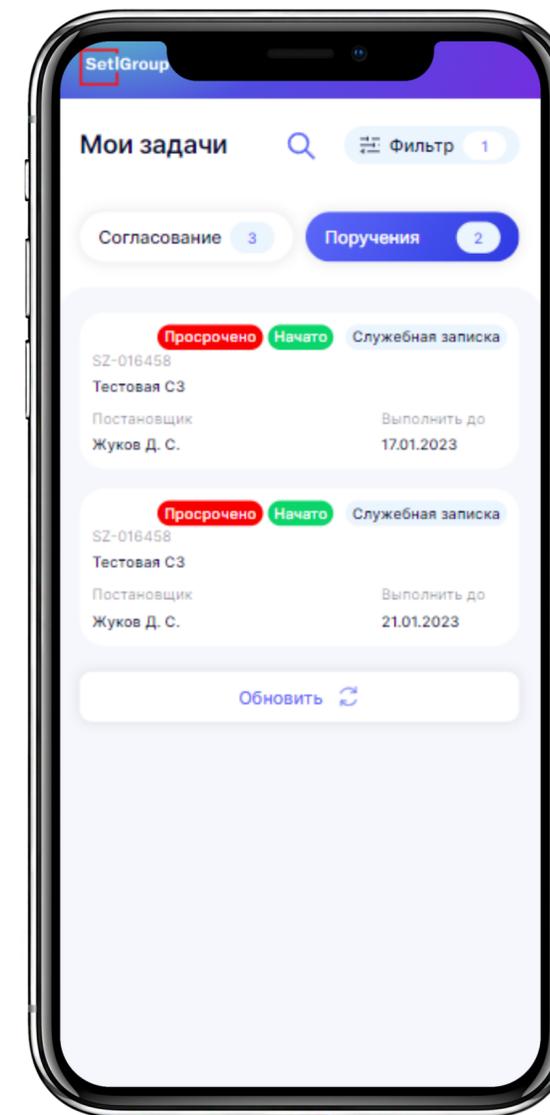

Просмотр выданных поручений

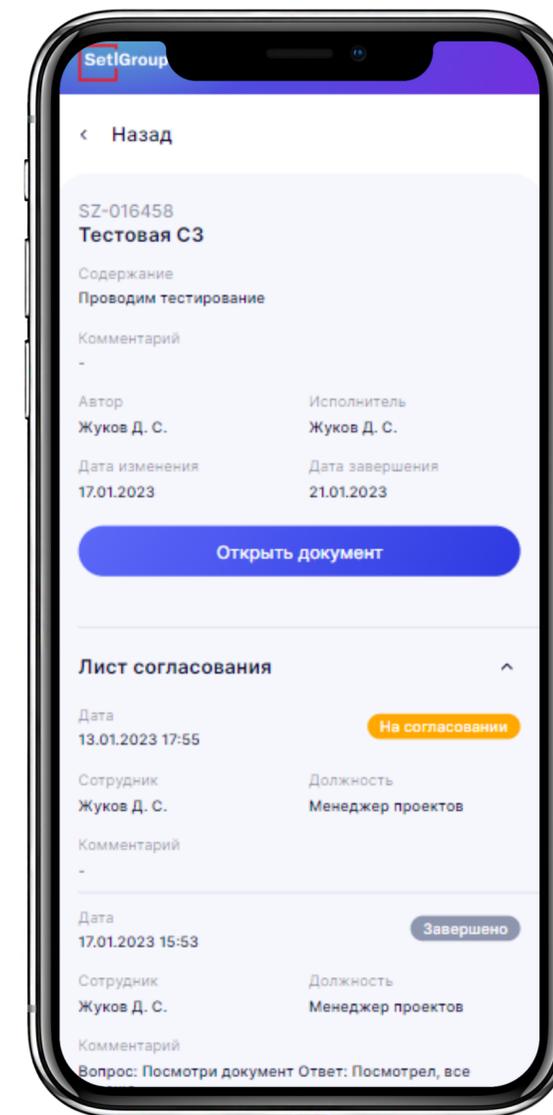

Карточка поручения

ПРОЗРАЧНОСТЬ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ПРОЦЕСС
КОНТРОЛЯ ПОДПИСАНИЯ
ДОГОВОРОВ ПОСТАВКИ/ПОДРЯДА

ПРЕИМУЩЕСТВА

1

ЕДИНАЯ БАЗА

Формирования графика тендеров на закупку материалов/поставку оборудования/договоров подряда и графика производства работ в единой базе, генератор договоров

2

КОНТРОЛЬ

Контроль подготовки и согласования графика тендеров, договоров, графика производства работ по договорам подряда

3

ПРОЗРАЧНОСТЬ


Автоматическое формирование отчета по договорам поставки, закупки, договорам подряда и графика производства работ с контролем сроков согласования на каждом этапе согласования

УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА

- ТЕНДЕРНО-ДОГОВОРНОЙ ОТДЕЛ
- БУХГАЛТЕРИЯ
- ГРУППА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
- ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
- ГРУППА ПО ПРАВОВОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ПОСТАВОК
- СМЕТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
- СЕКТОР УЧЕТА (ФЭО)



СОЗДАНИЕ КАРТОЧКИ ГРАФИКА ТЕНДЕРА

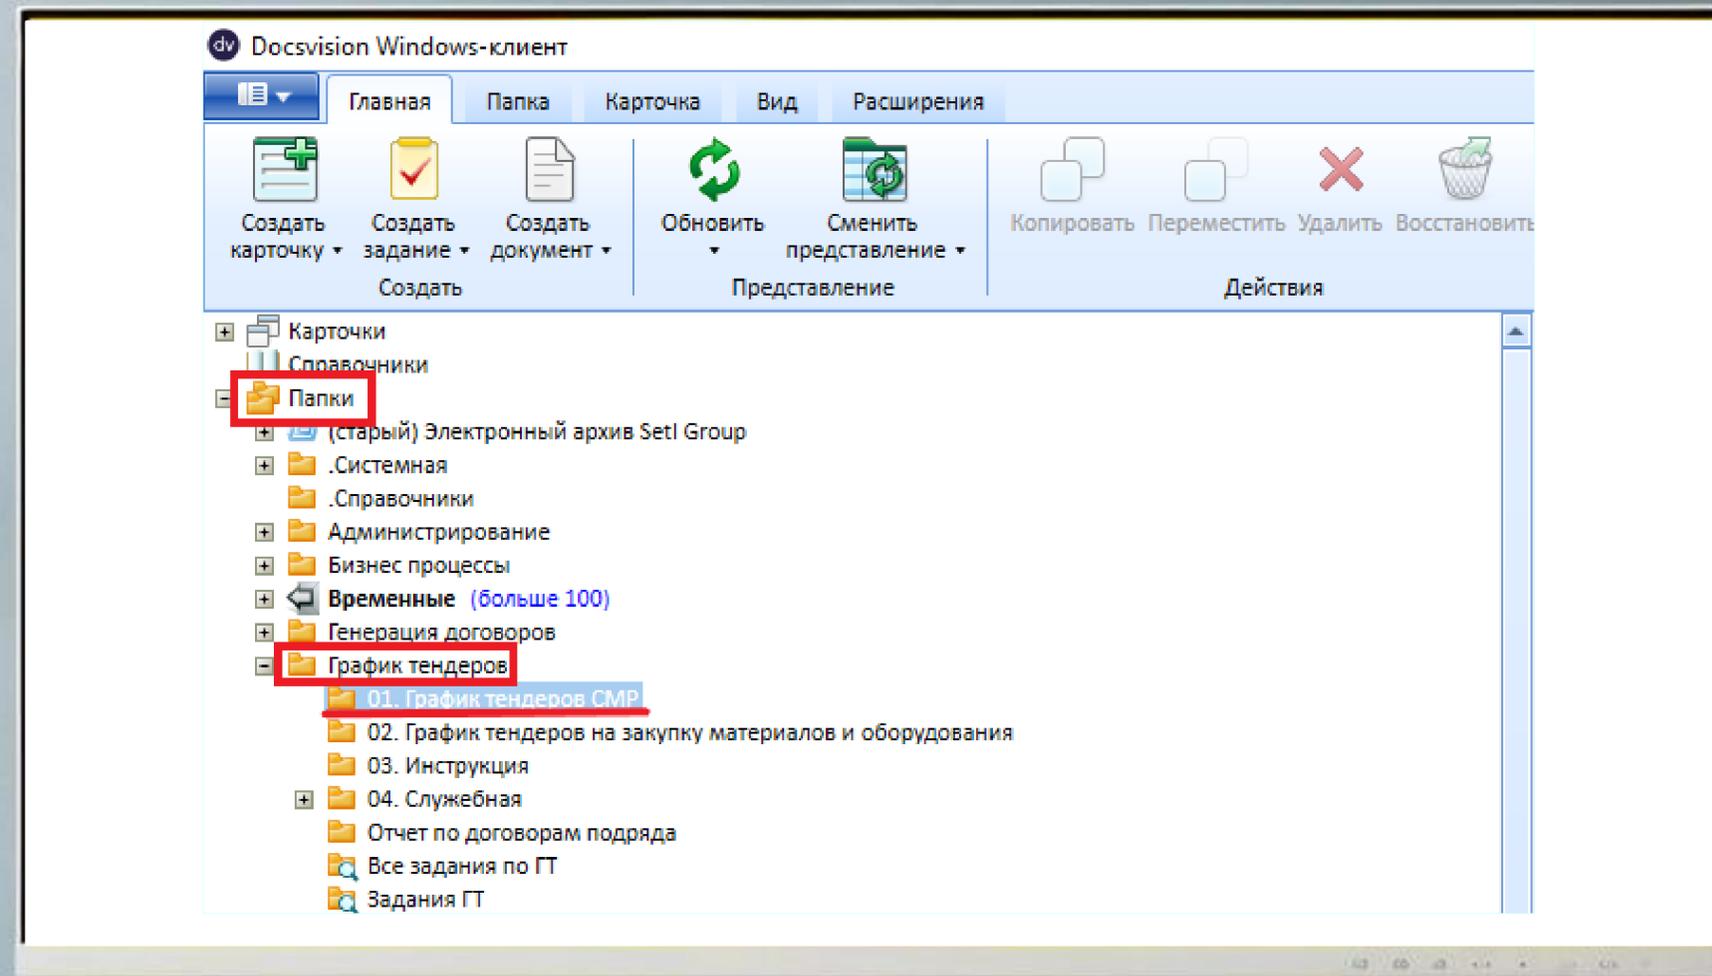

ЗАПОЛНЕНИЕ КАРТОЧКИ ГРАФИКА ТЕНДЕРОВ

Сохранить | Изменить ответственного | Аннулировать все результаты | Отправка заданий | Отправить повторное уведомление

График тендеров | История

Наименование вида работ: [] x Название тендера: [] x Ответственный РП: Капачев В. А. x

Объект: [] x Планируемая дата выполнения работ: []

Ответственный РПП: [] x Дата выдачи РД: []

Статус РД: Не начата Дата выдачи бюджетной стоимости: []

Комментарии к РД: []

Ответственный за выдачу ТЗ: [] x Дата выдачи ТЗ: []

Ответственный за проведение тендера: [] Утвержденная дата проведения тендера: []

Дата проведения: [] Результат тендера: []

Основания проведения тендера: [] Информационное письмо: []

Основания выбора победителя: []

График: [] x Договор: [] x

Инженер по строительству: [] x

| + | № п/п | Победитель | Вид документа | Номер документа | Дата документа | График | Договор | Поручительство | Поставка | Письмо о победе | Комментарий |
|---|-------|------------|---------------|-----------------|----------------|--------|---------|----------------|----------|-----------------|-------------|
| - | | | | | | | | | | | |
| x | | | | | | | | | | | |
| o | | | | | | | | | | | |

Папки\График тендеров\01. График тендеров СМР

ЗАПОЛНЕНИЕ КАРТОЧКИ ГРАФИКА ТЕНДЕРОВ

Наименование вида работ: ... X Название тендера: ... X Ответственный РП: Капнинов В.А. ... X

Объект: ... X Планируемая дата выполнения работ: ... X

Ответственный РПП: ... X Дата выдачи РД: ... X

Статус РД: Не начата Дата выдачи бюджетной стоимости: ... X

Комментарии к РД: ... X

Ответственный за выдачу ТЗ: ... X Дата выдачи ТЗ: ... X

Ответственный за проведение тендера: ... X Утвержденная дата проведения тендера: ... X

Дата проведения: ... X Результат тендера: ... X

Основания проведения тендера: ... X Информационное письмо: ... X

Основания выбора победителя: ... X

График: ... X Договор: ... X

Инженер по строительству: ... X

| № п/п | Победитель | Вид документа | Номер документа | Дата документа | График | Договор | Поручительство | Поставка | Письмо о победе | Комментарий |
|-------|------------|---------------|-----------------|----------------|--------|---------|----------------|----------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | | | | |

| Дата создания | Объект | Название тендера | Наименование вида работ | Дата выдачи РД | Дата выдачи бюджетной стоимости | Дата выдачи ТЗ | Утв. дата проведения тендера | Планируемая дата начала работ | Основания проведения тендера | Результат тендера | Дата проведения | Ответственный | Ответственный за выдачу ТЗ | Ответственный РП | Ответственный РПП | Комментарий к РД | Статус РД | Информационное письмо СДО | Победитель | ГПР | Договор | Комментарий |
|---------------|--|------------------|-------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------|---------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| 20.10.2022 | 1-ый Предпортовый проезд, 11, лит. А - оч. (кад. №78:14:0007 558:23) - 1 корп. | 23 - Котлован | Котлован тест | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 10.08.2022 | 09.09.2022 | 24.10.2022 | тест | проведен | 17.10.2022 | Гашлер Е.В. | Капнинов В.А. | Капнинов В.А. | Гагарин А.А. | тест2 | Не начата | | 111 000 | GPR-002586 | SGT-004075 | |

ОТПРАВКА ЗАДАНИЙ ОТВЕТСТВЕННЫМ СОТРУДНИКАМ

Отправка заданий и уведомлений

Задания Уведомления

| Задание | Статус | |
|---|------------|-----------|
| Задание на подготовку договора поставки по победителю РДС 000 | Завершено | Отправить |
| Задание на подготовку ГПР по победителю РДС 000 | Отправлено | Отправить |
| Задание на подготовку ГПР по победителю 01 СПБ 000 | Завершено | Отправить |

Отправить все

Ответить Ответить всем Переслать Мгновенные сообщения

Чт 01.06.2023 15:51

DocsVision Workflow Server
Подготовка шаблона договора по победителю тендера 01 СПБ 000

Кому: Капнинов Вадим Андреевич

Добрый день, Вадим Андреевич.

Необходимо подготовить шаблон договора по победителю тендера 01 СПБ 000.



Открыть задание по ссылке: [Ссылка на задание](#)

уведомление о конфиденциальности:

Это сообщение и приложения к нему являются конфиденциальными. Если Вы получили данное письмо по ошибке или случайности, пожалуйста, проинформируйте об этом отправителя по адресу электронной почты dvk@spbrealty.ru и примите меры по охране конфиденциальности информации путем уничтожения письма, всех его копий и прикрепленных к нему файлов. В случае ошибочного получения данного письма, Вы не имеете права использовать, копировать или перенаправлять данное письмо, текст/часть текста и прикрепленные к нему файлы.



ФОРМИРОВАНИЕ ШАБЛОНА ДОГОВОРА

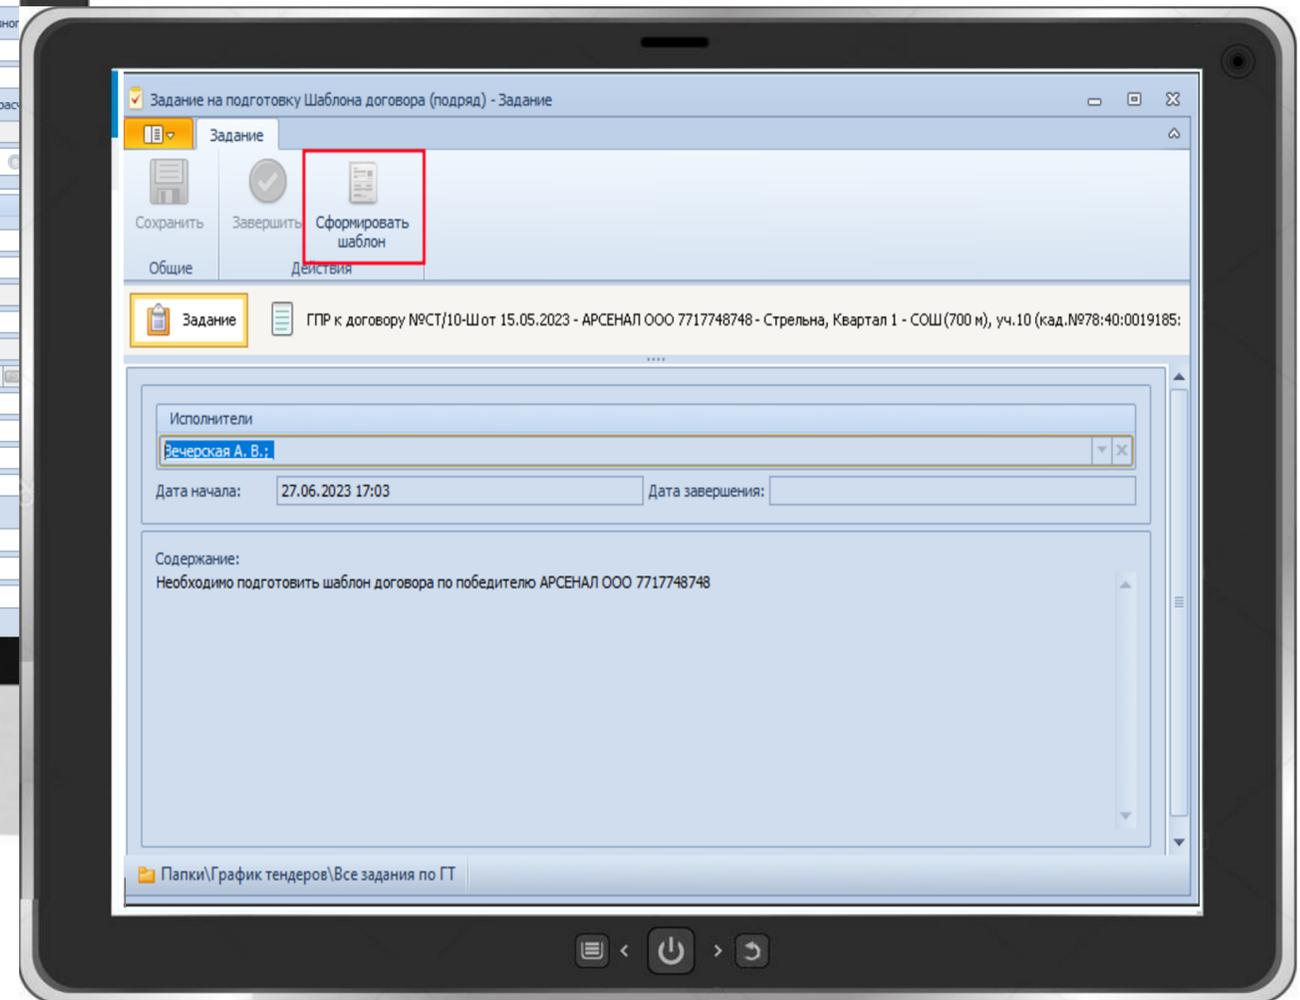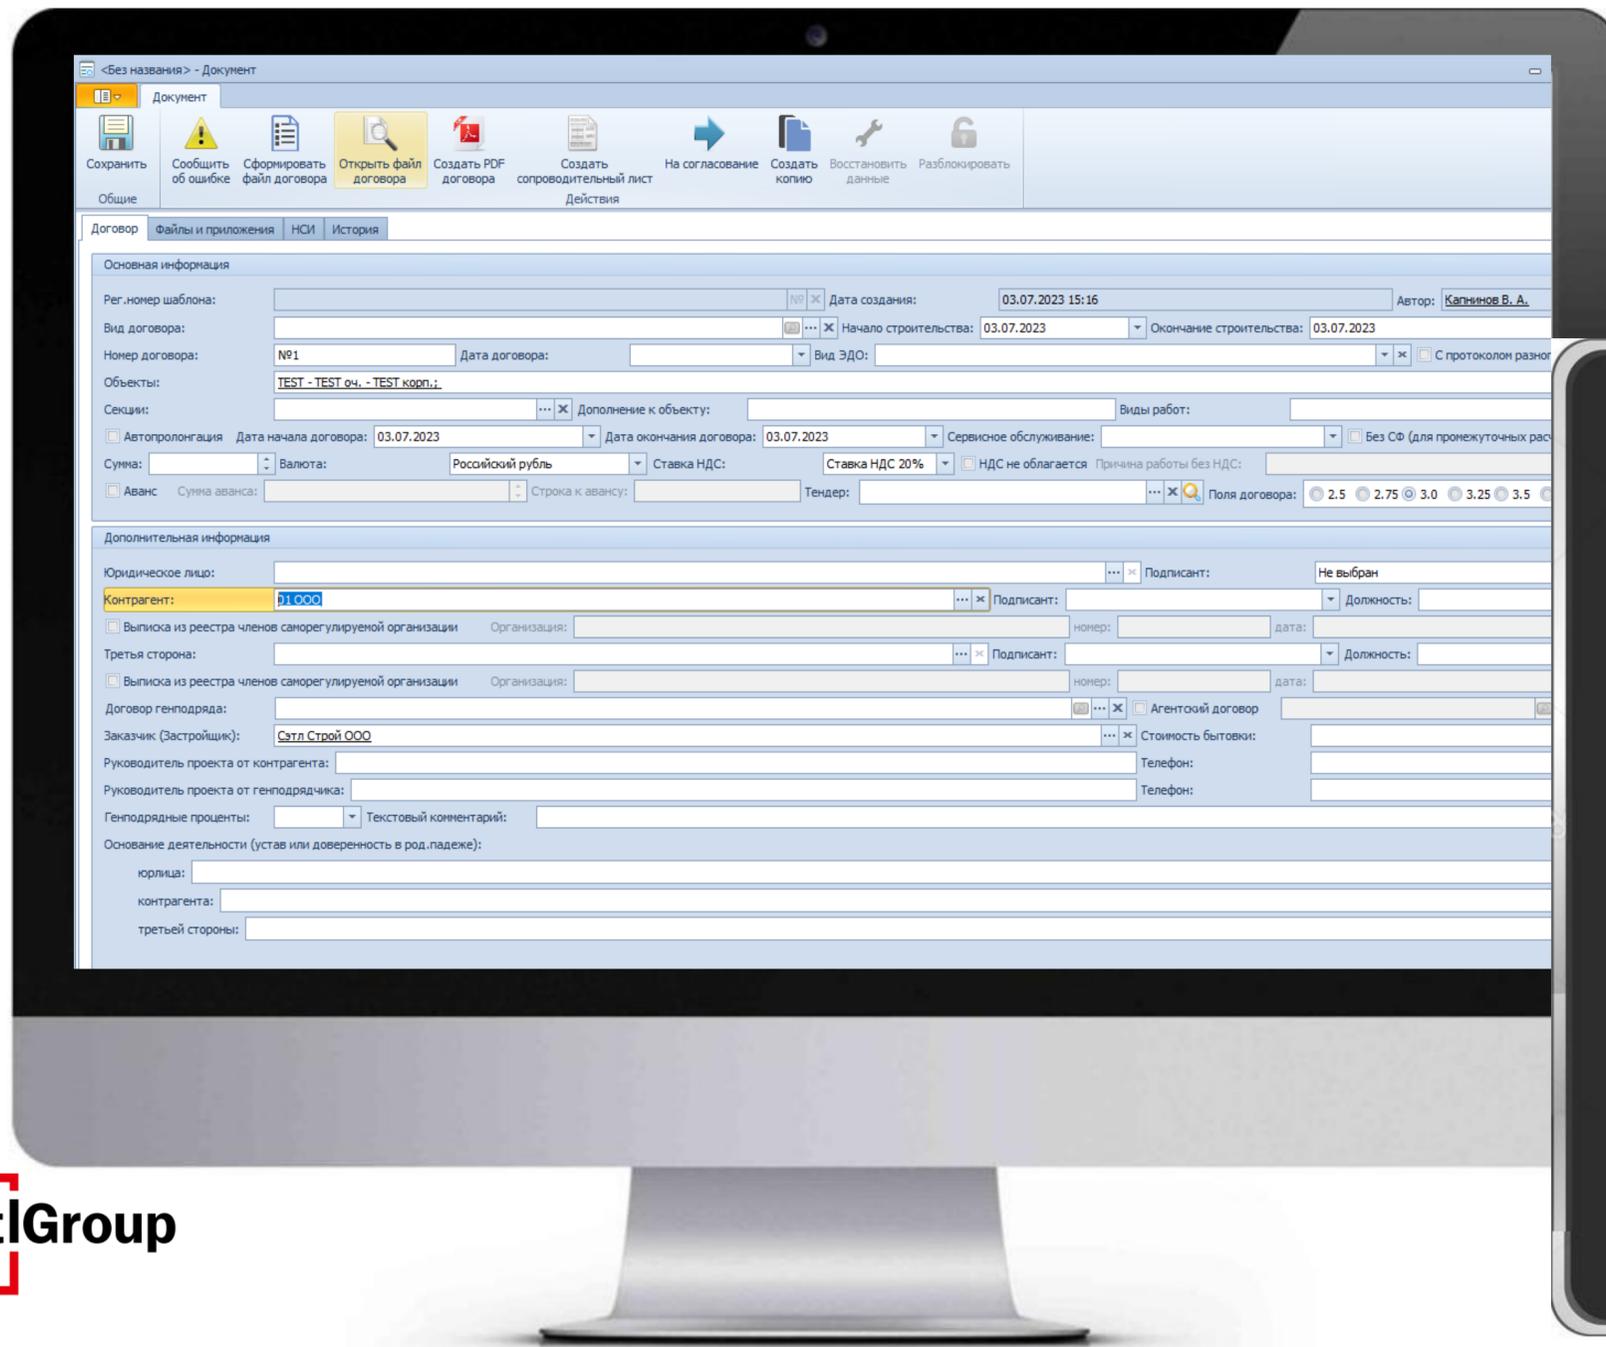

ЭДУАРД ВОСТРИЛОВ

Руководитель проектов

